別添資料6　アスベスト含有調査結果

●試料採取箇所

試料採取箇所一覧を表1に示し、試料採取箇所の詳細を図1～5に示す。

表1　試料採取箇所一覧

施設名称	番号	建物内・外	採取箇所	採取部位	形状又は材質	備考
市営上小阪東住宅	34	外部	西棟　北妻側	外壁	吹付塗材	
	35	外部	西棟　南妻側	外壁	吹付塗材	※2
	36	外部	西棟　西ケタ側	外壁	吹付塗材	
	37	外部	西棟　東ケタ側	外壁	吹付塗材	
	38	外部	東棟　北妻側	外壁	吹付塗材	
	39	外部	東棟　南妻側	外壁	吹付塗材	※3
	40	外部	東棟　西ケタ側	外壁	吹付塗材	
	41	外部	東棟　東ケタ側	外壁	吹付塗材	
	42	外部	玄関ホール等　天井	天井	吹付塗材	
	43	外部	集会所　外壁	外壁	吹付塗材	
	44	内部	403 号便所　床	床	塩ビ系シート	
	45	内部	904 号便所　床	床	塩ビ系シート	
	46	内部	915 号便所　床	床	塩ビ系シート	
	47	内部	1413 号便所　床	床	塩ビ系シート	
	48	内部	403 号便所.浴室.洗面所　天井	天井	成形板	
	49	内部	904 号便所.浴室.洗面所　天井	天井	成形板	
	50	内部	915 号便所.浴室.洗面所　天井	天井	成形板	
	51	内部	1413 号便所.浴室.洗面所　天井	天井	成形板	
	52	内部	403 号玄関.DK.和室　天井	天井	吹付塗材	※1
	53	内部	904 号玄関.DK.和室　天井	天井	吹付塗材	※1
	54	内部	915 号玄関.DK.和室　天井	天井	吹付塗材	
	55	内部	1413 号玄関.DK.和室　天井	天井	成形板	
	56	内部	917 号玄関.DK.和室　天井	天井	吹付塗材	※4

※1　ヒル石の含有が認められた為、外注分析とした。

※2　通路窓が開閉できなかったため、2 階で 3 ヶ所の採取を行った。

※3　通路窓が開閉できなかったため、1 階で 3 ヶ所の採取を行った。

※4　1413 号玄関.DK.和室の天井が成形板であったため、同改修年の吹付塗材を別検体とするため採取を行った。

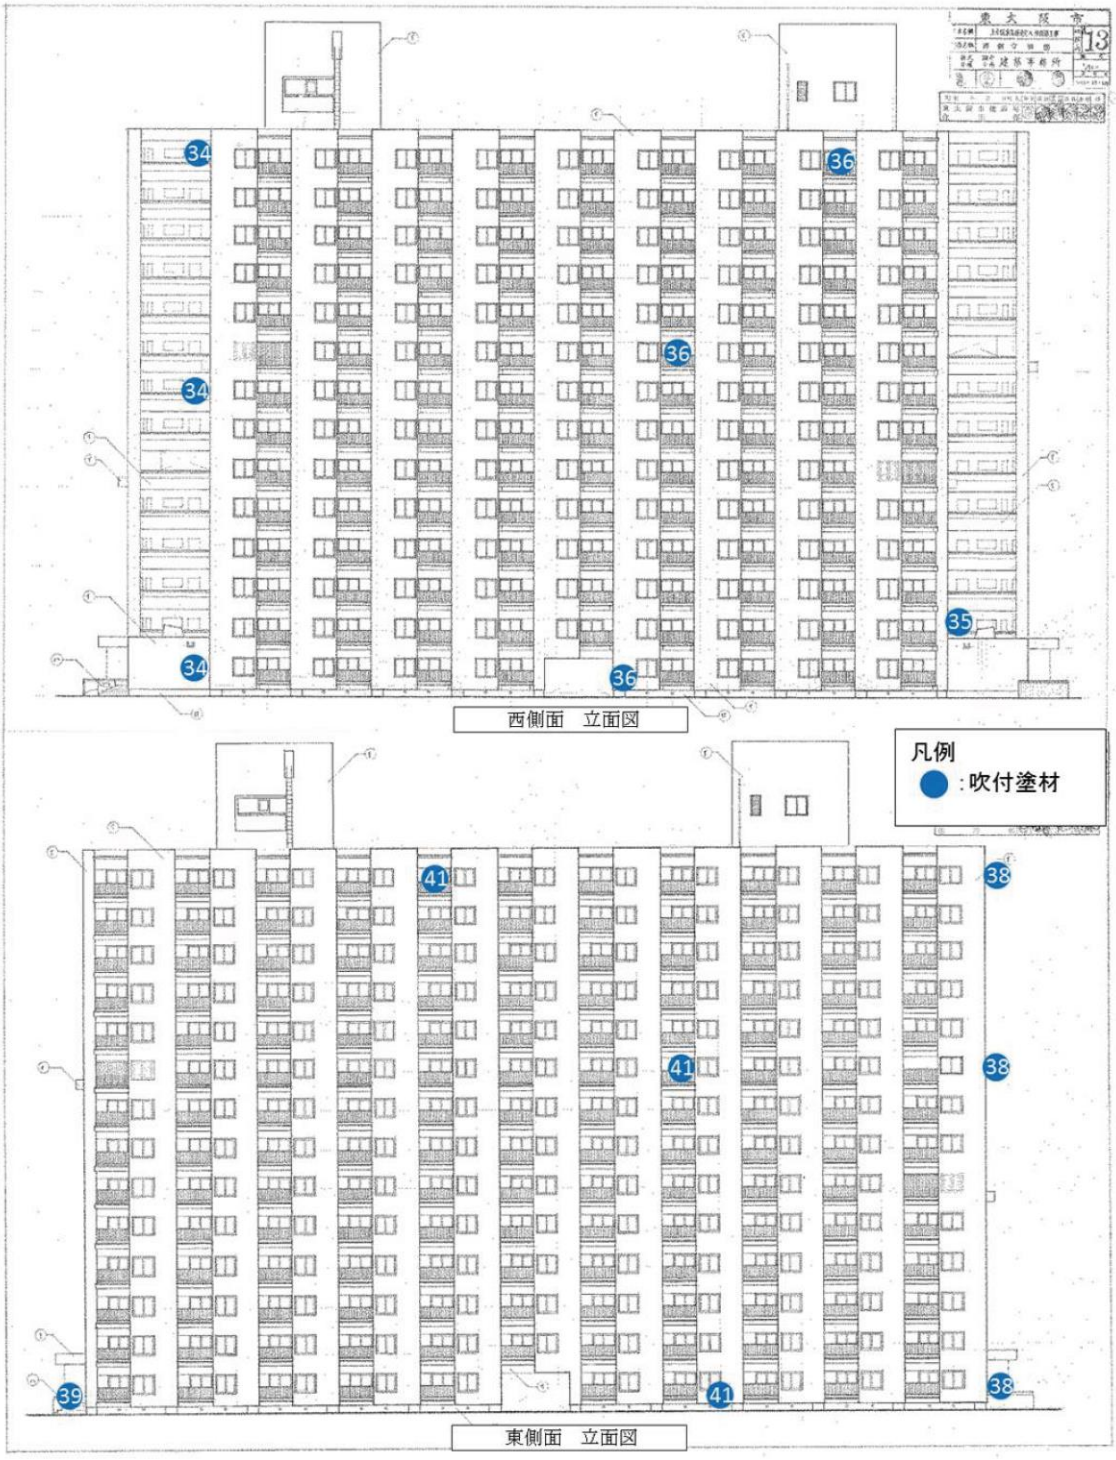

図１　試料採取箇所図（市営上小阪東住宅外部回り）

図２　試料採取箇所図（市営上小阪東住宅外部回り断面）

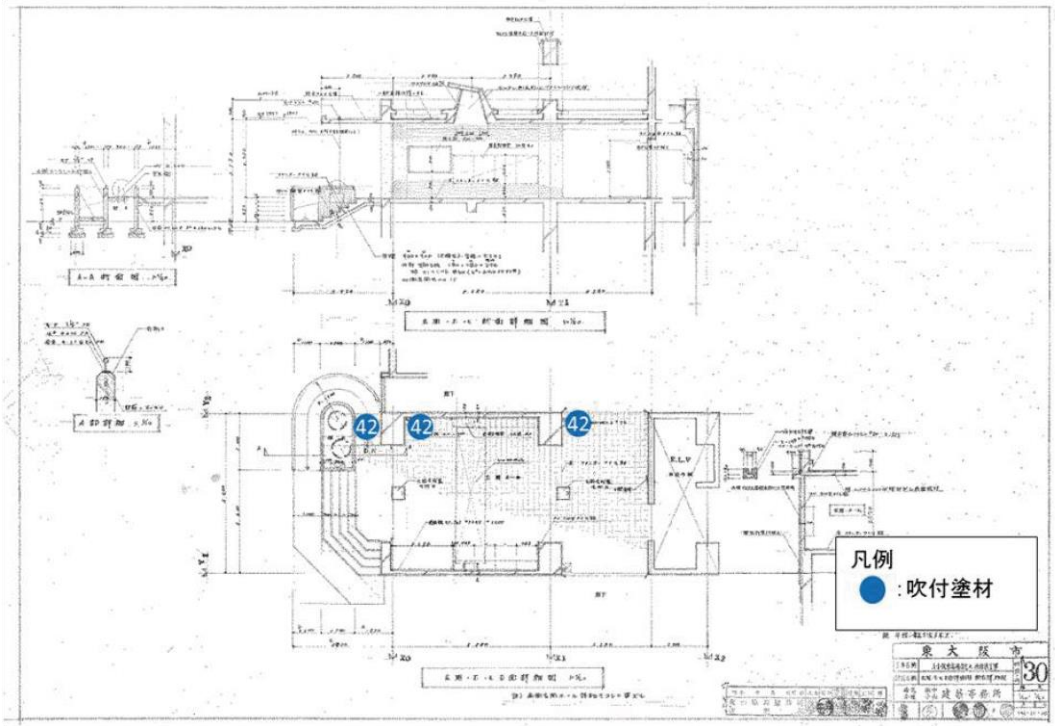

図３　試料採取箇所図（市営上小阪東住宅玄関ホール）

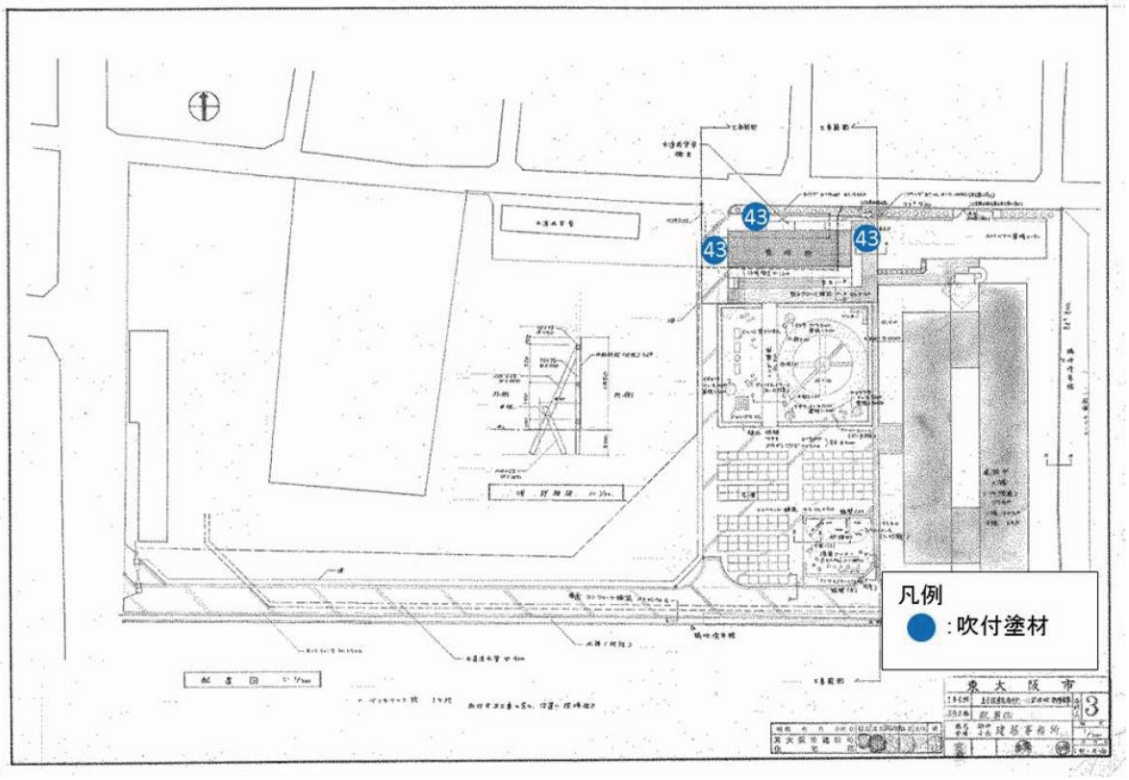

図 4　試料採取箇所図（市営上小阪東住宅集会所）

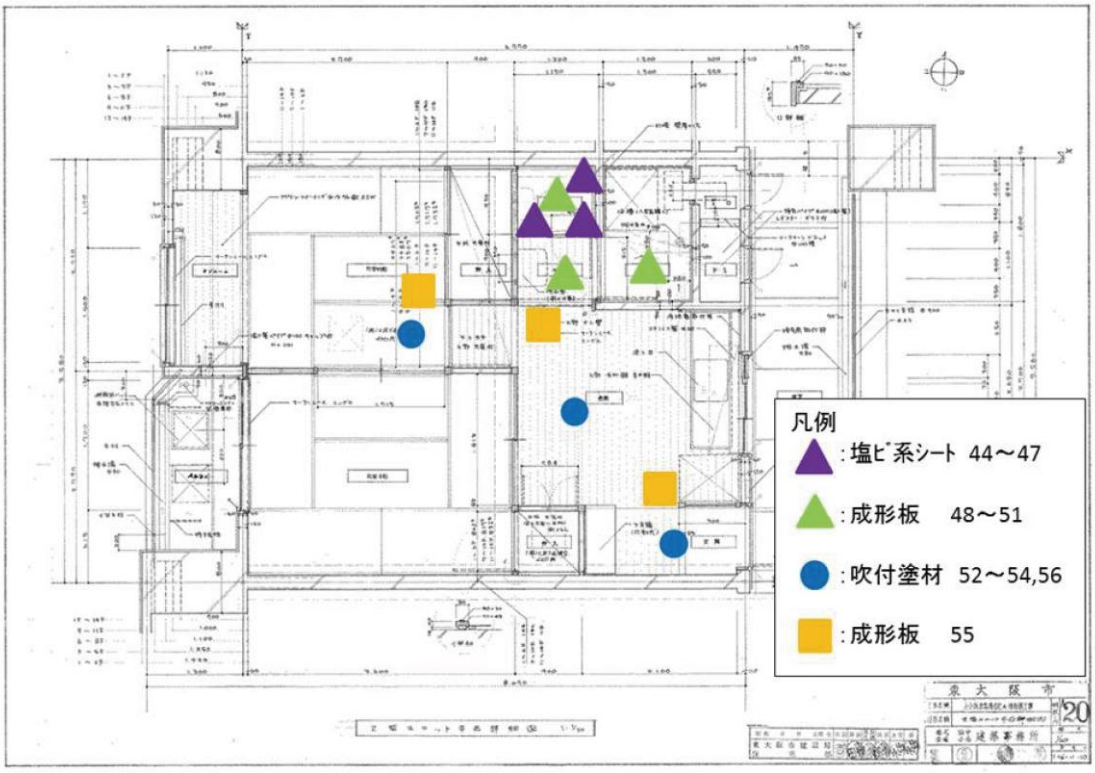

図 5　試料採取箇所図（市営上小阪東住宅 403・904・915・1413・917 号室内）

●分析結果一覧表

対象施設	番号	建物内・外	採取箇所	採取部位	分析結果		
					定性分析	定量分析（%）	該当レベル
市営上小阪東住宅	34	外部	西棟　北妻側	外壁	無検出	－	
	35	外部	西棟　南妻側	外壁	無検出	－	
	36	外部	西棟　西ケタ側	外壁	無検出	－	
	37	外部	西棟　東ケタ側	外壁	無検出	－	
	38	外部	東棟　北妻側	外壁	クリソタイル	0.12	下地：レベル３
	39	外部	東棟　南妻側	外壁	クリソタイル	1.7	下地：レベル３
	40	外部	東棟　西ケタ側	外壁	無検出	－	
	41	外部	東棟　東ケタ側	外壁	クリソタイル	2.8	下地：レベル３
	42	外部	玄関ホール等　天井	天井	無検出	－	
	43	外部	集会所　外壁	外壁	クリソタイル	1.5	塗材：レベル１
	44	内部	403 号便所　床	床	クリソタイル	0.34	接着剤：レベル３
	45	内部	904 号便所　床	床	クリソタイル	0.59	接着剤：レベル３
	46	内部	915 号便所　床	床	クリソタイル	0.61	接着剤：レベル３
	47	内部	1413 号便所　床	床	クリソタイル	0.37	接着剤：レベル３
	48	内部	403 号便所.浴室.洗面所　天井	天井	クリソタイル	5-50※1	レベル３
	49	内部	904 号便所.浴室.洗面所　天井	天井	クリソタイル	5-50※1	レベル３
	50	内部	915 号便所.浴室.洗面所　天井	天井	クリソタイル	5-50※1	レベル３
	51	内部	1413 号便所.浴室.洗面所　天井	天井	クリソタイル	5-50※1	レベル３
	52	内部	403 号玄関.DK.和室　天井	天井	無検出	－	
	53	内部	904 号玄関.DK.和室　天井	天井	無検出	－	
	54	内部	915 号玄関.DK.和室　天井	天井	無検出	－	
	55	内部	1413 号玄関.DK.和室　天井	天井	クリソタイル	0.26	レベル３
	56	内部	917 号玄関.DK.和室　天井	天井	無検出	－	

■：アスベストが検出されたことを示す。

※1 推定含有率を記載
