

東大阪市立図書館基本構想の改訂について(案)

1. 改訂に係る背景

平成27(2015)年3月、「今後の市立図書館全体の機能・サービス等のあり方を整理したうえで、再整備する新たな2館がどのような機能・サービスを担うべきかを検討するため」、「東大阪市立図書館基本構想」(以下、「基本構想」という。)が策定された。

同基本構想では、「3.図書館サービス網の整備方針」および「4.図書館サービスの整備方針」に個別の取組を示しており、各取組を「東大阪市公共施設再編整備計画」等他の計画のスケジュールと整合を図りつつ推進するため、「5.実施スケジュール」に、平成27(2015)年度から平成33(令和3)(2021)年度までの7年間のロードマップとして、「表2 図書館サービス網と図書館サービスの整備に向けた実施スケジュール」を掲げている(p.18-19)。

基本構想の策定以降、市では、同構想に基づき図書館サービス網と図書館サービスの整備に努めており、平成28(2016)年6月に旭町図書館を新たに四条図書館として、また令和2(2020)年5月に永和図書館(暫定施設)を新たに永和図書館としてそれぞれ開館するなど、その具体化を推進してきた。

なお、基本構想の実施スケジュールで、「図書館サービス網の整備」に関わる「他施設との複合機能化」に掲げる「文化複合施設」(新東部地域図書館)の整備計画については、コロナ禍への対応のさなかにあった令和2(2020)年10月、計画の一旦凍結が示され、市長が凍結期間を「2年間程度」と発言されたことを受けて、令和4(2022)年10月にはその後の方針について一定の判断がくだされる見通しである。

2. 文化複合施設整備計画について

○当初のスケジュール

令和2年度 (2020年度)	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)
4月 6月 8月 10月 12月 2月	4月 6月 8月 10月 12月 2月	4月 6月 8月 10月 12月 2月	4月 6月 8月 10月 12月 2月
アドバイザー業務			移転 供用開始
設計・施工			

○令和2年度第1回公共施設マネジメント推進会議(令和2年7月9日開催)

当該計画の一旦凍結を決定

○市長の定例記者会見(令和2年9月)

当該計画の凍結期間を「2年間程度」と発言

○令和2年第3回定例会(令和2年10月)

当該事業に係る予算(債務負担行為)の廃止を上程・可決

⇒当該計画の一旦凍結が正式に決定

3. 現基本構想に基づく取組と新構想の策定準備


基本構想の「実施スケジュール」7年間の取組成果を踏まえつつ、未だスケジュールを示していない令和4(2022)年度以降の取組については、市立図書館を取り巻く諸般の情勢変化や新たな課題にも適確に対応できるよう、すみやかに明示していく必要がある。

そのため、市ではこれまで、令和4(2022)年度についても基本構想の具体化を図る取組を進めるとともに、令和5(2023)～6(2024)年度に新たな基本構想(以下「新構想」という)の策定を準備し、令和7(2025)年度から新構想を策定し推進することを期してきた。

そこで、このたび、基本構想における主な事業の実施状況を精査し、それぞれの進捗の程度に応じて今後必要な対策(案)を整理するとともに、現下においてとりわけ重点的に行う必要があると考える施策(案)を別添【資料 2-2】のとおり整理したところである。

図書館協議会において、これらの対策(案)や施策(案)のうち、当面必要と考えられるものについて検討いただき、現基本構想の「実施スケジュール」を令和4年度の1年間(令和5年3月まで)追加する中で推進するものとした。

なお、文化複合施設については、上記1. に示した経過により、令和4(2022)年10月にその整備計画について判断が下される見込みであることから、その結果を見たうえで、令和5(2023)年度以降の実施スケジュールへの位置づけ方についても検討し、新構想の策定準備に反映していくものとする。

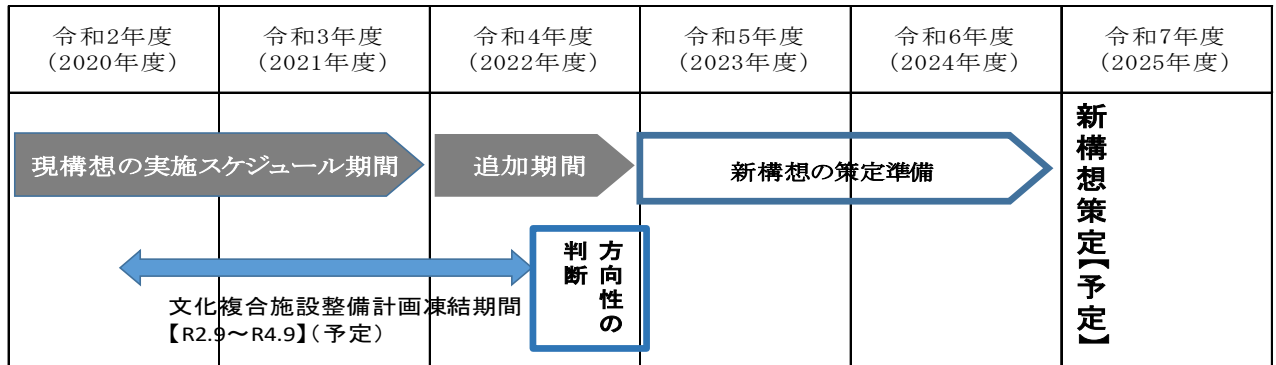

4. 実施スケジュールの期間追加に係る改訂方針(案)

(1) 実施スケジュール期間	<ul style="list-style-type: none"> ・平成 27(2015)～平成 33(2021)年度 ⇒ 平成 27(2015)～令和 4(2022)年度
(2) 主な施策	<ul style="list-style-type: none"> ・現在掲げている施策を基本とする。 ・「新東部地域図書館」の名称や「新永和図書館」のスケジュール等、当時の状況と異なっているものについては現在の情報に書き換える。 ・元号が「平成」から「令和」に変更したことに伴い、該当箇所を書き換える。
